Amar Seafood

Innmelding av posisjoner for akvakulturanlegg

Lokalitetsnavn:	Helsøya 2
Lokalitets no:	
Fylke:	Trøndelag
Kommune:	Hitra
Dato oppdatert	19.10.2024

Lagrings ramme

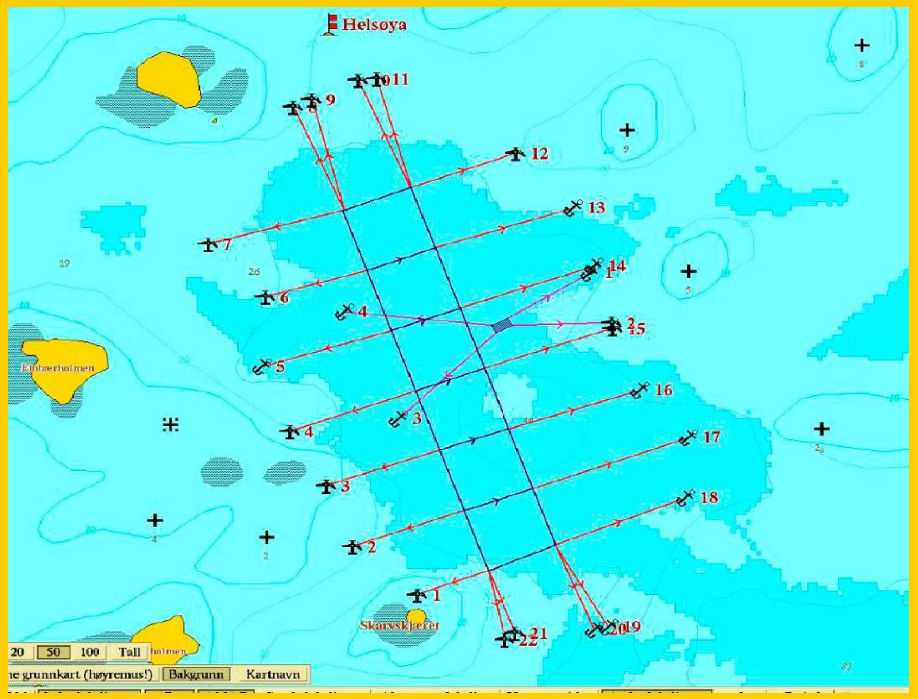

Merknader

Possisjoner Anker anlegg	GPS NORD	GPS ØST	Anker Dyp	Avstand til Anlegget	Tot Lengde Fortøyning	Faktor	Tau Dim	Anker Dim
no 1	63°32.724	08°22.848	14	83	84,17	6,01		
no 2	63°32.756	08°22.459	34	130	134,37	3,95		
no 3	63°32.798	08°22.424	40	131	136,97	3,42		
no 4	63°32.835	08°22.377	46	146	153,08	3,33		
no 5	63°32.878	08°22.339	53	148	157,20	2,97		
no 6	63°32.926	08°22.344	43	115	122,78	2,86		
no 7	63°32.962	08°22.269	31	153	156,11	5,04		
no 8	63°33.055	08°22.381	26	142	144,36	5,55		
no9	63°33.060	08°22.405	25	144	146,15	5,85		
no10	63°33.073	08°22.466	32	148	151,42	4,73		
no11	63°33.073	08°22466	32	141	144,59	4,52		
no12	63°33.024	08°22.676	25	123	125,51	5,02		
no13	63°32.986	08°22.752	46	160	166,48	3,62		
no14	64°32.946	08°22.779	50	157	164,77	3,30		
no15	63°32.904	08°22.805	38	150	154,74	4,07		
no16	63°32.865	08°22.867	65	174	185,74	2,86		
no17	63°32.830	08°22.905	59	182	191,32	3,24		
no18	63°32.789	08°22.901	50	154	161,91	3,24		
no19	63°32.701	08°22.799	52	119	129,87	2,50		
no20	63°32.700	08°22.781	55	116	128,38	2,33		
no21	63°32.698	08°22.675	34	84	90,62	2,67		
no22	63°32.693	08°22.661	32	88	93,64	2,93		
Senter forflåte	63°32.906	08°22.658						
Senter anlegg	63°32.874	08°22.585						
Poss anker flåte								
fl.1	63°32.942	08°22.774	51	105	116,73	2,29		
fl.2	63°32.908	08°22.804	38	110	116,38	3,06		
fl.3	63°32.843	08°22.519	65	152	165,31	2,54		
fl.4	63°32.915	08°22.448	69	162	176,08	2,55		

Hjørneposs Anlegg			Dyp
1	63°32.984	08°22.446	72
2	63°33.000	08°22.535	67
3	63°32.757	08°22.727	68
4	63°32.740	08°22.638	43
5			
6			
Fortøynings bøye			
f5			
f6			

Lokklasse		
50 års	Verdi	Retning
Hs		
Vc-5m		
Vc-15m		

Hovedkomponenter

RAMME	Plastringer
TYPE RINGER	160 m
DYBDE NØTER	15 meter
ANTALL BUR	6

NB: Ankerpossisjonene kan bli noe justert etter utlegging av anlegget,dette vil bli oppdatert.
